



Le Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley

Lettre d'information du chantier d'insertion

3

Depuis le mois dernier, après le week-end Pascal, de nouveaux éléments sont venus renforcer l'équipe : Franck , Mustafa, Tahar, Kamel et Jean Claude.

En attendant le retour de Nacer, l'équipe est ainsi au complet. A l'occasion de ces nouvelles arrivées, nous avons récapitulé l'ensemble des travaux prévus pour BISSY II.

Pour ce qui est de l'avancée des travaux, (qui a été quelque peu freinée par une semaine de congés en milieu de mois) il a été procédé aux opérations suivantes :

1° SANITAIRE

Après le démontage d'une cloison et de quelques lourdes marches, l'ouverture de la porte d'entrée a été réalisée. L'ajustement et la mise en place des jambages pour reconstituer l'entrée a également été effectuée, dans le respect du style du château. Après l'implantation des niveaux, coté rangement et coté sanitaire (traçage, remblais, ...) nous avons coulé les fondations et les 2 dalles puis commencé à élever le mur de séparation ainsi que la réalisation d'un escalier.



2° FOUR A PAIN

Nous avons mis en place le tirant et reconstruit les murs dans leur aspect d'origine puis les marches d'entrée et le caniveau ont été posés, ensuite nous avons procédé à la restitution des dalles extérieures et intérieures à l'aide des relevés topographiques et repérages effectués auparavant.

3° COUR


La partie du mur d'enceinte qui menaçait de s'effondrer a été remaillée pierre par pierre au mortier de chaux. Suite aux travaux de terrassement, nous avons remis la cour en état par un nettoyage et une remise en herbe et une reconstitution du dallage devant l'entrée du logis pour rendre le site plus accueillant aux visiteurs, d'autant plus que le « marché du curieux » aura lieu le week-end du 19 et 20 mai et qu'il attirera certainement son lot de visiteurs curieux.



Pour les semaines à venir nos objectifs seront les suivants; à savoir :

- ◇ Réaliser l'auvent et construire les diverses portes extérieures (écurie, grange et sanitaire)
- ◇ Reconstruction des voûtins du plafond des sanitaires dans l'aspect d'origine.

Pour l'auvent, un exercice a été conçu, consistant en des montages de différents tenons et mortaises pour faire un tableaux de rangement des outils et aussi en vue de nous faire la main pour la réalisation de l'auvent lui-même, et des diverses portes.

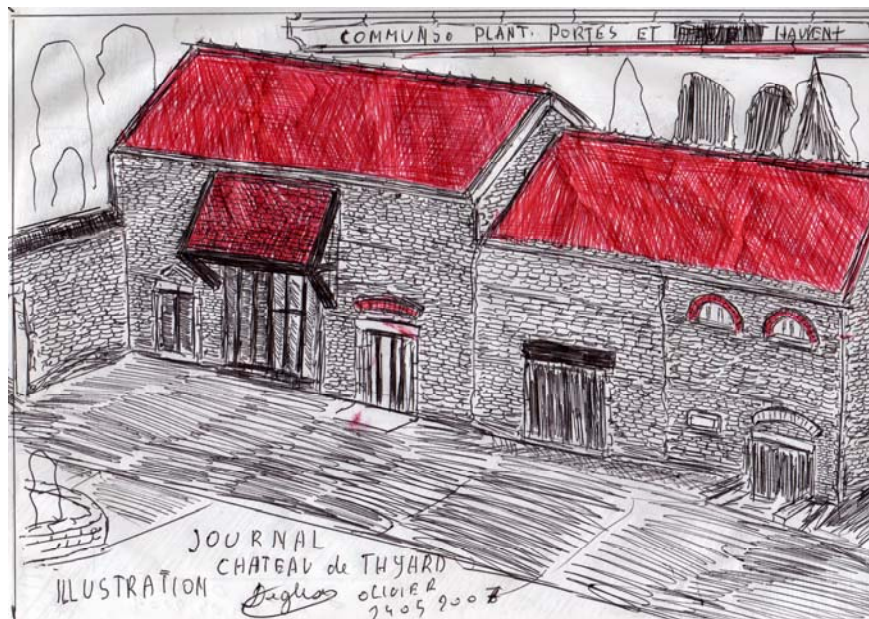

Avec le concours financier de :

Conseil Général de Saône-et-Loire

Direction Départementale
Du Travail de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires Culturelles
De Bourgogne



Contact :

TREMPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
&
P.H.A.R.E.
Mairie - 71640 GIVRY
BP 80010 BLANZY
<http://www.tourdubost.com>
