



Lettre d'information du chantier d'insertion

Juin
2013

N° 3

Puits Hottinguer - Epinac

Après un fabuleux mois de mai ensoleillé, nous avons enfin reçu notre échafaudage. Sous la direction de Romain, l'équipe composée de Farid, Mickaël, Miloud et David a commencé l'assemblage. Il nous faut d'abord analyser les différentes pièces le constituant. Nous décidons de le monter à l'aile où se situe le laboratoire. L'équipe commence par niveler le sol afin de faciliter le calage des pieds, il faut ensuite placer des morceaux de bois de différentes épaisseurs sous les pieds, ce qui va améliorer la stabilité de la structure. Nous devons vérifier les niveaux au fur et à mesure du montage et corriger si cela s'avère nécessaire, il ne faut pas que l'échafaudage soit bancal. Une fois arrivée en haut, l'équipe s'attèle à monter une autre partie mais cette fois-ci dans la ruelle, les 2 côtés de l'aile du laboratoire seront ainsi échafaudés. La dalle en béton facilite grandement le calage, il suffit simplement de régler la hauteur des pieds. La hauteur étant plus petite, le montage s'effectue en un clin d'œil. Une autre partie est également assemblée à l'intérieur de l'aile, cela facilitera le travail de démontage de l'ancienne charpente ainsi que les travaux sur les différentes maçonneries.



Jean-Charles, malgré son caractère de « cochon » mais plein de bonne humeur et de courage, a découpé, avec l'aide de Steve, l'escalier de la ruelle ainsi que le toit d'un bâtiment annexe de l'entreprise Bitulac. Ils ont également restauré l'ancien circuit électrique de l'atelier charpente afin que la lumière soit. Et la lumière fut.





Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremlinhp@tremlinhp.com
<http://www.tremlinhp.com>
<http://www.tourdubost.com>

TREMLIN
Homme et Patrimoine

Les charpentiers, de leur côté, ont déjà fabriqué 22 fermes en un peu plus d'un mois. Un test d'assemblage d'une ferme modèle est réalisé afin d'anticiper les difficultés éventuelles que nous pourrions rencontrer lors de la mise en place. Lors de cet essai, nous constatons qu'il nous faudra au minimum 4 personnes pour l'assemblage. La partie gauche de la ferme est assemblée entièrement. La partie droite est présentée, emboîtée sauf au niveau de la mortaise de l'entrait. Nous testons différentes méthodes pour l'emboîter puis Joseph, notre technicien, se munit d'un pied de biche et effectue quelques mouvements sur l'arbalétrier et réussit à l'assembler sur l'entrait.

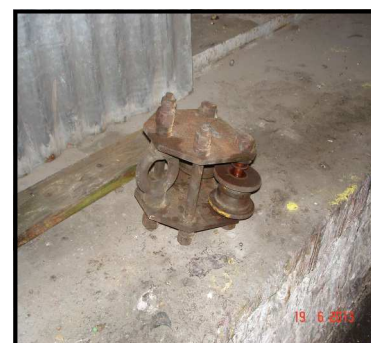

D'autres travaux de nettoyage, de piquetage se poursuivent également dans les autres ailes du Puits Hottinguer. L'équipe autunoise remplit sa tâche à la perfection.

Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire



UT 71 DIRECCTE



Fonds Social Européen



Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

Pays de l'Autunois-Morvan



Ville d'Epinac



Pôle-Emploi

