



Lettre d'information  
du chantier d'insertion

AOUT/SEPTEMBRE  
2014

N°93

Domus Phoenix - La feuille du Beuvery

Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine  
Maison Tiger  
Hameau médiéval de Brancion  
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION  
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30  
tremlinhp@tremlinhp.com  
<http://www.tremlinhp.com>  
<http://www.tourdubost.com>  
<https://www.facebook.com/tremlinhp>

Les travaux sur les murs de l'atrium sont terminés. C'est le rectangle que vous pouvez voir à l'arrière de la grande image où nous travaillions encore au moment de la prise de vue depuis la nacelle du manitou. Vous distinguez aussi la canalisation qui le traverse. Vidée et restaurée elle va rester visible. Les pierres de couverture ont été remises en place et maçonnées. Une partie reste ouverte à cause d'un manque de pierres suite à un sondage de monsieur Bulliot. Il faut bien sûr imaginer des colonnes sur les murs qui forment ce rectangle pour voir l'atrium. Voici une image qui pourra vous y aider. Il est prévu de créer des fenêtres dans le sol pour suivre le chemin de la canalisation, elle traverse la cour en forme de croix grecque, passe sous le bassin pour sortir de la Domus par le vestibule.



Dans le même temps, nous entretenons les espaces verts et aidons Thomas du service technique de Bibracte à monter ou démonter des abris. Nous avons aussi aidé Ciara l'archéologue responsable des fouilles sur la Domus PC1 à déboucher une autre canalisation pour évacuer l'eau stagnante dans la fouille. Notre aide a aussi été nécessaire pour soulever certaines pierres de couverture de la canalisation. Des sangles et une barre de fer nous ont servis pour les bouger sans effort.

TREMLIN  
Homme et Patrimoine

Il va maintenant falloir mettre de la terre dans l'atrium pour créer le sol, un grand nombre de bennes de terre tamisée va être apporté par Thomas, à nous de la niveler. A l'aide d'un cordeau placé sur le côté intérieur du mur nous avons la hauteur désirée et avec une grande règle de quatre mètres nous reportons les points de repère pour rester droit. La canalisation n'étant pas de niveau, pour faciliter l'écoulement des eaux, nous allons créer une légère pente pour que les pierres de couverture restent visibles. A l'endroit où il n'y en a pas, une tôle de fer sera placée pour retenir la terre.



Avec le concours de :

Conseil Général de la Nièvre



DIRECCTE  
UT de la Nièvre



Fonds Social Européen



Union européenne

Ce projet est cofinancé par  
le Fonds social européen

Direction Régionale des Affaires  
Culturelles De Bourgogne




Pôle-Emploi



BIBRACTE



Francis et Bruno sont chargés de restituer le foyer de la pièce BJ. Pour commencer, une fois tous les relevés et dessins du foyer d'origine faits lors de la fouille par les archéologues, nous l'avons démonté. La partie la plus endommagée retirée, nous avons placé un géotextile puis du sable pour le protéger sur lequel une dalle fabriquée par nos soins a été placée. Pour respecter l'arrondi du foyer un gabarit a été fabriqué, des morceaux de tuiles taillés et râpés servent à restituer fidèlement cet objet.

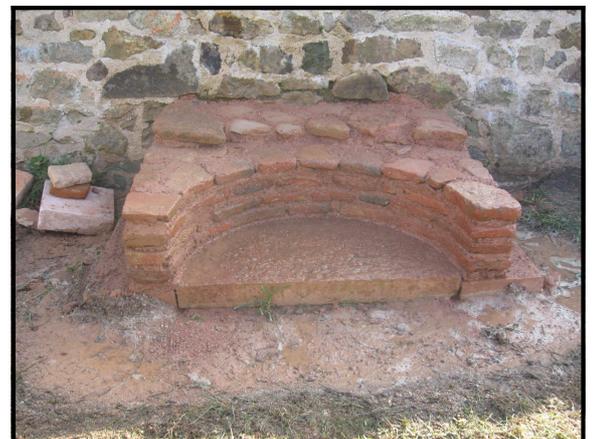

Le mortier utilisé pour coller les tuiles est composé de chaux et d'amphores pilées pour que le rendu ressemble à l'original.
