Journal de MEAUCE

N°15 OCTOBRE 2022

Lettre d'information du chantier d'insertion

Travaux de consolidation et de sécurisation

Dans la perspective de retirer la croûte de béton posée sur la voûte et avant de pouvoir réaliser la couverture en laves, nous devons consolider et étayer la voûte afin d'éviter tout risque de chutes.

Après avoir échafaudé l'intérieur du pigeonnier nous avons entièrement restauré le rang de pierres de corniche, avec remplacement des pierres manquantes, avant de reprendre les maçonneries sur une hauteur de 50 cm afin d'avoir des appuis solides.

Sur cette base de corniches nous avons pu mettre en appui des pannes avec des entretoises sur lesquelles nous avons posé un plancher amené à recevoir l'étaiement de la voûte.

Ne pouvant plus accéder par l'intérieur, nous nous sommes employés à reprendre les maçonneries de la lucarne qui reste le seul accès à notre plateforme.

Pour ce faire nous avons en grande partie démonté la maçonnerie existante avant de remonter les assises de pierres avant de repositionner le linteau de pierre. A l'arrière de celui-ci nous avons réalisé, sur la profondeur un linteau en pièces de chêne.

L'accès à la plateforme sécurisé, nous avons pu entreprendre les travaux d'étaiement de la voûte.

Des plaques de contreplaqué de 5mm, suffisamment souple pour épouser la forme de la voûte ont été maintenues par des bastaings posés en oblique et fixés au sol et aux plaques.

Tous les matériaux utiles à ces travaux ont été acheminés grâce au monte-charge et à l'échafaudage.

Nous allons pouvoir décrouter la voûte dans de bonnes conditions et réaliser les consolidations par l'extérieur avant d'envisager de poser les premiers rangs de laves.

Pendant ce temps une partie de notre équipe a changé les pierres de la corniche extérieure sommitale qui étaient soit cassées soit disparues.

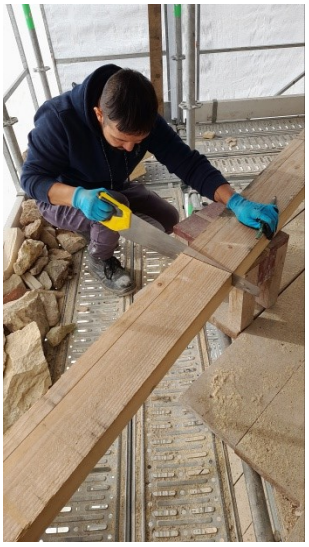

Dans la perspective de la 5ème édition de Festi'Grues organisée, nous avons entièrement nettoyé et sécurisé notre chantier. Les grues cendrées qui font escale en ce moment nous observent et nous encouragent et ne manquent pas de commenter bruyamment !!!

Nous avons également eu le plaisir de présenter notre action à Philippe Toussaint le Président de l'association VMF (Vieilles Maisons Françaises) qui était en visite à Meauce.

Avec le concours de

TREMPLIN Homme et Patrimoine

NIÈVRE le département

l'Europe s'engage en Bourgogne-Franche-Comté

Union européenne
Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen

TREMPLIN Homme et Patrimoine
Espace Revermont
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Liberté
Égalité
Fraternité

RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Fondation FFB
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
sous l'égide de la Fondation de France

PRÉFET DE LA NIÈVRE
Liberté
Égalité
Fraternité

pôle emploi

CHÂTEAU DE MEAUCE
