# Journal de Brancion

N°152 JANVIER 2023

Lettre d'information du chantier d'insertion

## Lavoir de Saint Huruge

Malgré le froid les travaux de restauration du lavoir situé sur la commune de Saint-Huruge progressent. Nous avons terminé les travaux de remontage du mur au droit de l'abreuvoir et nous attendons la fin du gel pour procéder au jointoyage.
A l'intérieur du lavoir, nous avons repris les rigoles périphériques qui ne jouaient plus leur rôle pour faciliter l'écoulement des eaux. Nous avons également implanté une grille de protection au-dessus du tuyau d'alimentation du lavoir.
Sur la toiture, nous avons déposé, à chaque extrémité, les tuiles afin de changer les chevrons de rives en très mauvais état. Nous les avons remplacés par des chevrons neufs, posé des coyaux et refait le littelage. Pendant ce temps une partie de l'équipe récupérait des tuiles sur une ancienne construction.

## Mur en pierre sèche

Nous avons entrepris la restauration d'un nouveau mur en pierre sèche de 30 mètres de long.
Après avoir repris le calage sur une longueur de 3 mètres, nous avons démonté une première tranche de 10 mètres en évacuant toute la végétation qui l'avait envahi et en extrayant toutes les pierres enfouies dans le sol. En repartant des fondations nous avons entrepris le remontage du mur en s'alignant sur des cordeaux. Nous avons été contraints, non sans difficulté, d'intégrer un acacia dans notre construction, car les propriétaires ne souhaitaient pas s'en séparer. Les travaux se poursuivront dans les semaines à venir.

## Maison RABUT à Brancion

Depuis plusieurs années, la maison Rabut accueille pendant la saison touristique des artistes et des artisans d'art. Il devenait urgent de reprendre les enduits de façade qui étaient bien dégradés.

Nous avons donc commencé par échafauder la façade avant de pouvoir piqueter les enduits. Après un nettoyage à haute pression pour bien purger les maçonneries, nous avons réalisé un gobetis sous la conduite de Wilfried. Il nous reste à faire le dégrossi et l'enduit de finition, mais pour cela nous devons attendre la fin du gel, tout en terminant avant la fin du mois de mars, car dès le 1er avril la salle accueillera un nacrier.

## A l'Espace Revermont

Nous poursuivons pas à pas les travaux de réhabilitation de l'Espace Revermont et actuellement nous sommes dans la réalisation des carrelages et de la pose de faïence dans les deux WC. Nous avons commencé par faire un ragréage au sol afin de d'obtenir une surface plane. Nous avons ensuite posé les carrelages en prenant bien soin de vérifier les angles des murs avant de faire les découpes puis la pose. Après le carrelage, nous avons posé la faïence en étant cette fois-ci attentifs aux niveaux.

Il nous reste à réaliser les joints avant de réinstaller les WC.

## Jardin de voûtes

Le terrain inoccupé sous la maison Rabut va accueillir des maquettes de différents modèles de voûtes romanes. Pour les installer nous préparons des emplacements. Après avoir pris les mesures pour l'implantation, nous avons matérialisé l'emprise des voûtes par un marquage au sol avec des bombes de peinture. Puis munis de pioches et de pelles nous avons retiré la terre pour mettre le sol de niveau avant de creuser l'emplacement des fondations aux angles.

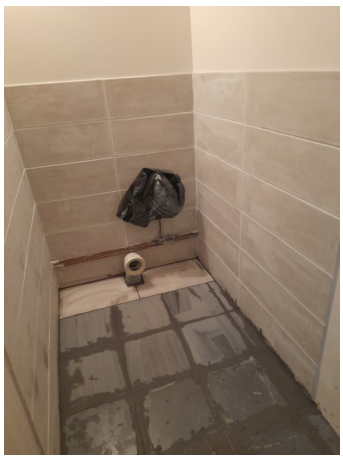

## Accueil de nouveaux collègues

Gaëtan a rejoint depuis peu notre équipe et il s'est très vite intégré. Quant à Albert il exécute 200 heures de TIG. Ce renfort nous aide beaucoup dans nos nombreux travaux et activités.


**TREMPLIN Homme et Patrimoine**
**Espace Revermont**
**Hameau Médiéval de Brancion**
**71700 MARTAILLY-LES-BRANCION**
**Tél. : 03 85 32 90 30**
**tremplinhp@tremplinhp.com**
**http://www.tremplinhp.com**
**http://www.tourdubost.com**
**https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp**


Avec le concours de

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

eDF
fape | AGIR POUR L'EMPLOI

SAÔNE & LOIRE DÉPARTEMENT

pôle emploi
